

Etude d'avant projet

N°	Désignation de la tâche	Description de la tâche	Durée	Début au + tôt	Fin au plus tard	Prédécesseur	Charge
1	Préfabrication T05H6	Traçage et découpe des pièces constituant l'ensemble T05H6	1j	05/07/04 (jour 1)			16 h
2	Préfabrication T05H5	Traçage et découpe des pièces constituant l'ensemble T05H5	1j				16 h
3	Préfabrication T05B2	Traçage, découpe et formage des pièces constituant l'ensemble T05B2	2j				32 h
4	Préfabrication T05B1	Traçage, découpe et formage des pièces constituant l'ensemble T05B1	2j				32 h
5	Préassemblage T05H6	Assemblage des pièces constituant l'ensemble T05H6	4j			1	128 h
6	Préassemblage T05H5	Assemblage des pièces constituant l'ensemble T05H5	4j			2	128 h
7	Préassemblage T05B2	Assemblage des pièces constituant l'ensemble T05B2	5j			3	160 h
8	Préassemblage T05B1	Assemblage des pièces constituant l'ensemble T05B1	3j			4	96 h
9	Retournement T05H6	Retournement de l'ensemble T05H6	1j			5	24 h
10	Retournement T05H5	Retournement de l'ensemble T05H5	1j			6	24 h
11	Retournement T05B2	Retournement de l'ensemble T05B2	1j			7	24 h
12	Prémontage T05H	Assemblage des ensembles T05H6 et T05H5	5j			9 ; 10	160 h
13	Prémontage T05B	Assemblage des ensembles T05B2 et T05B1	6j			8 ; 11	192 h
14	Peinture T05H	Sablage et peinture du demi bloc T05H	2j			12 (FD+1j)	32 h
15	Peinture T05B	Sablage et peinture du demi bloc T05B	2j			13 (FD+1j)	32 h
16	Prémontage et préarmement T05	Assemblage des demi blocs T05H et T05B et préarmement du bloc T05	15j		20/08/04 (jour 35)	14 ; 15	720 h

Synoptique de réalisation du bloc T05


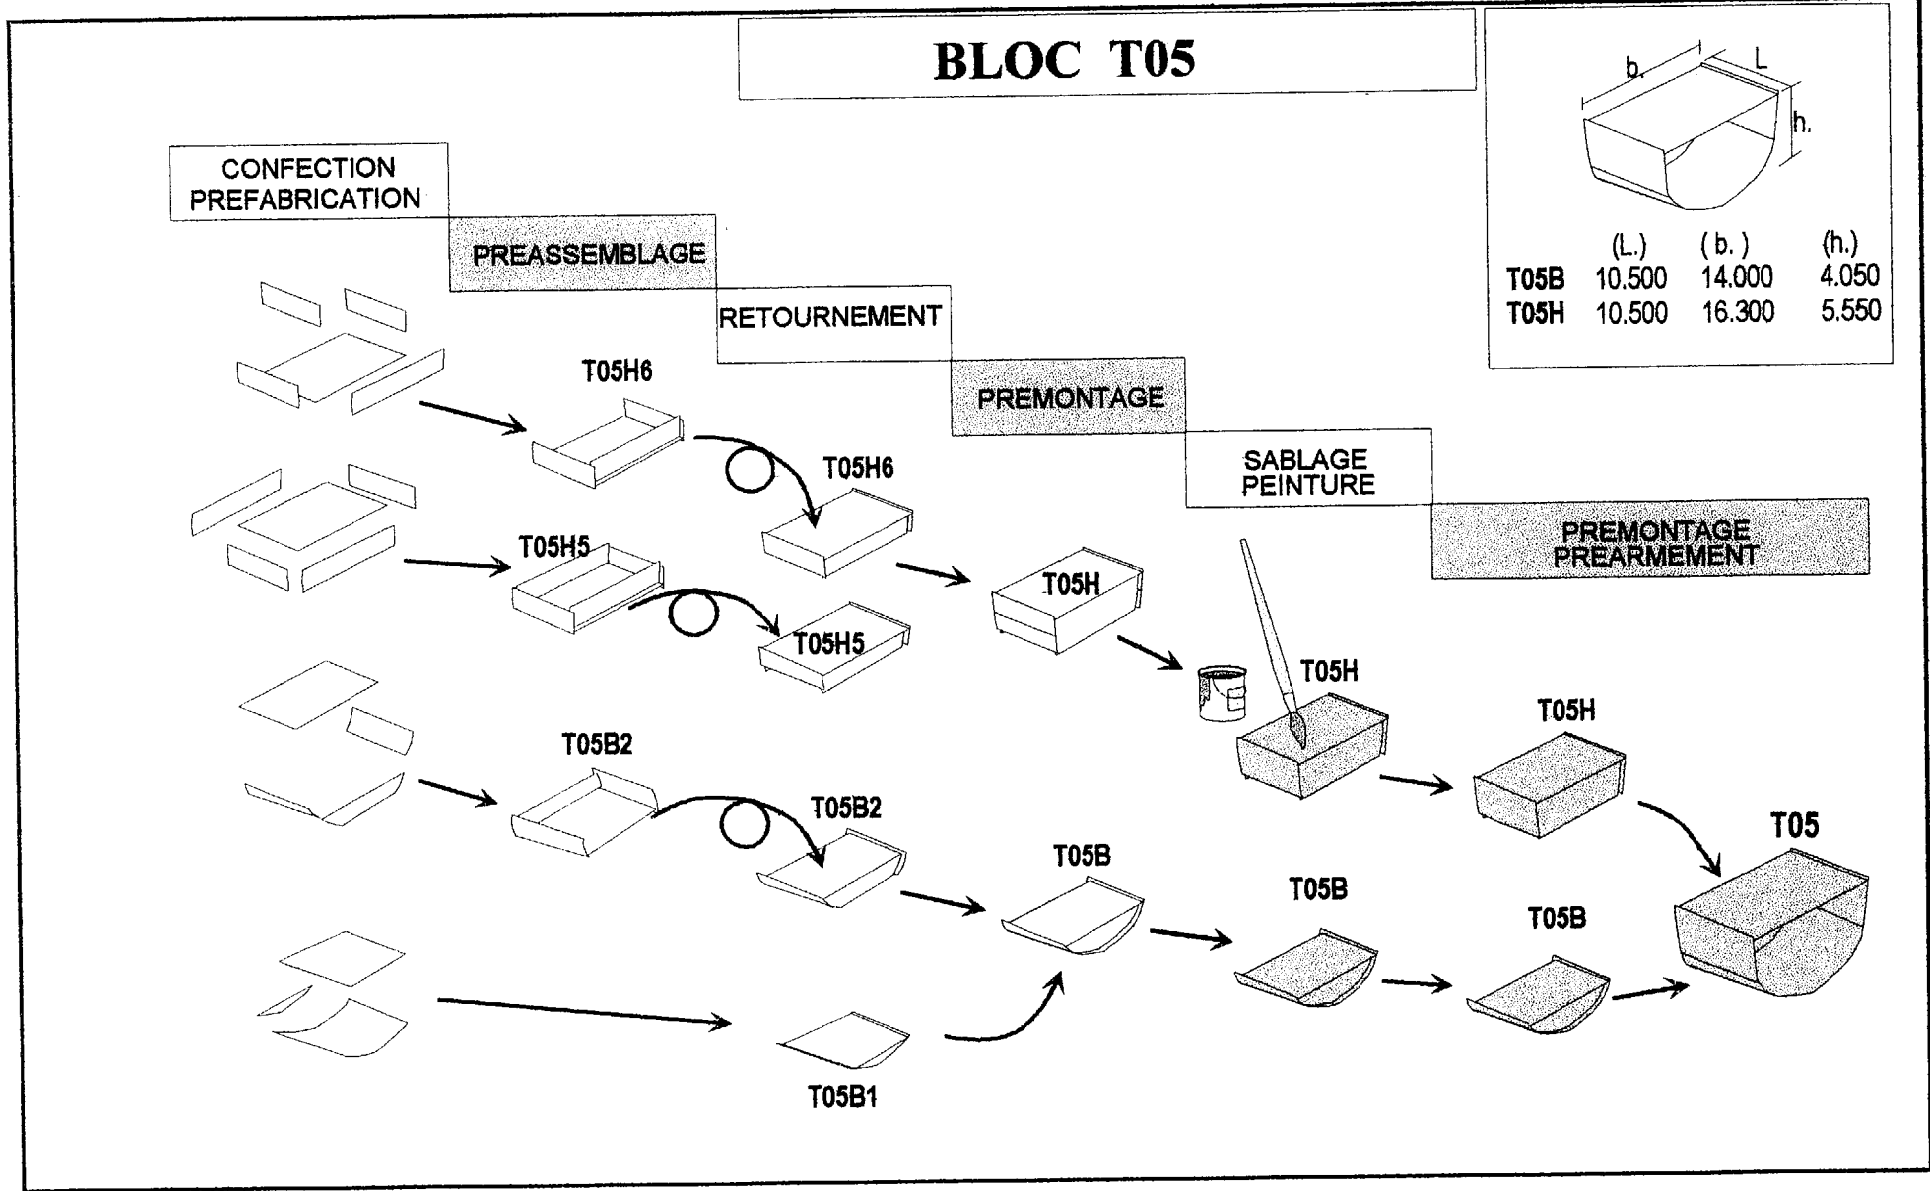



Diagramme de Gantt au plus tôt

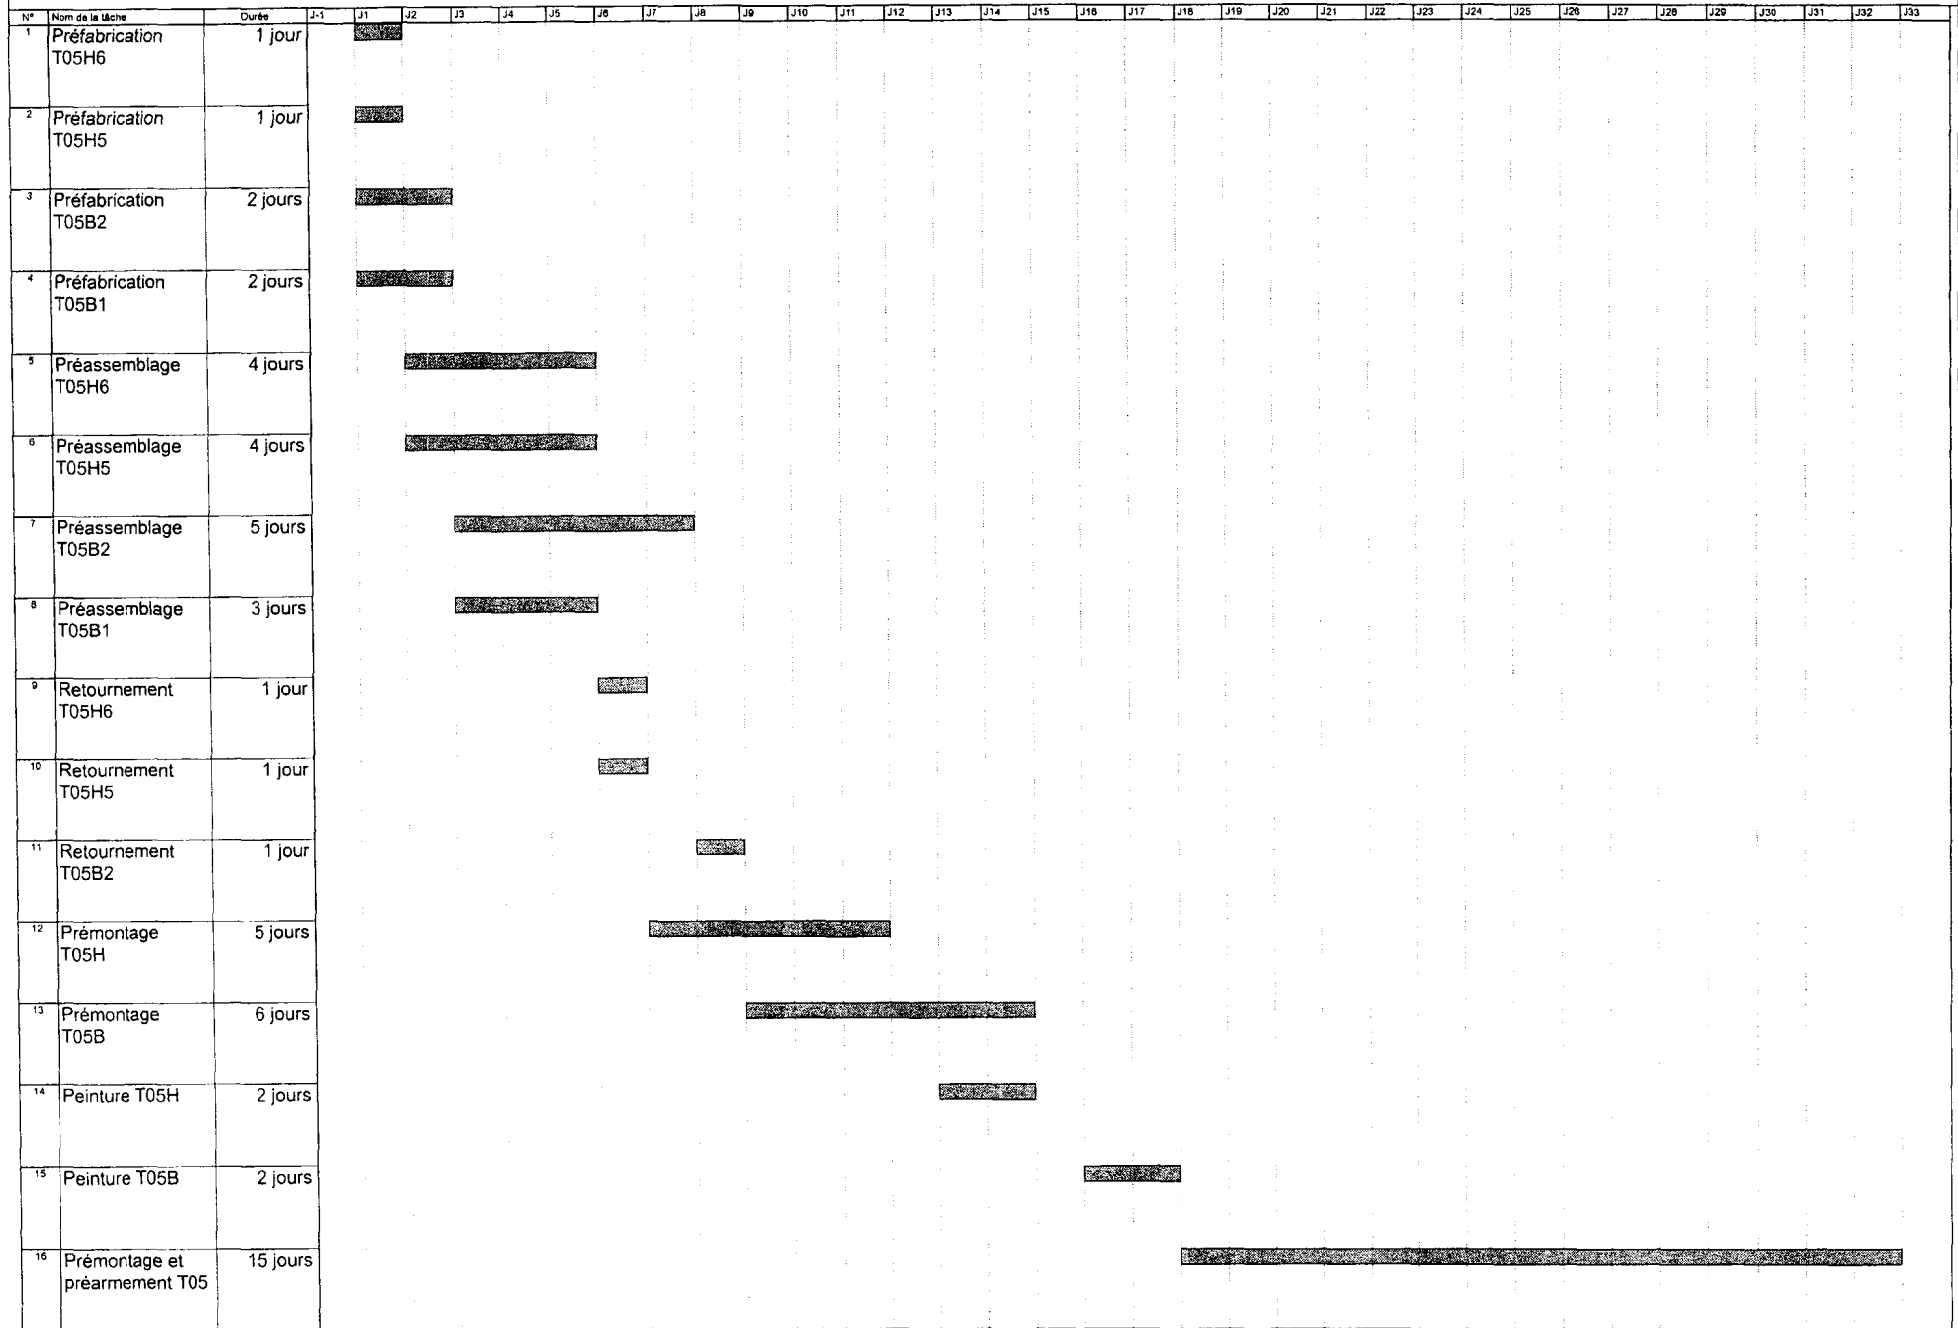

Projet: Projet1	Tâche		Jalon		Tâche reportée		Avancement reporté		Tâches externes		Regrouper par an-tête	
Date: Ven 06/02/04	Avancement		Récapitulative		Jalon reporté		Fractionnement		Récapitulative de projet			


CNORG

Diagramme de charge

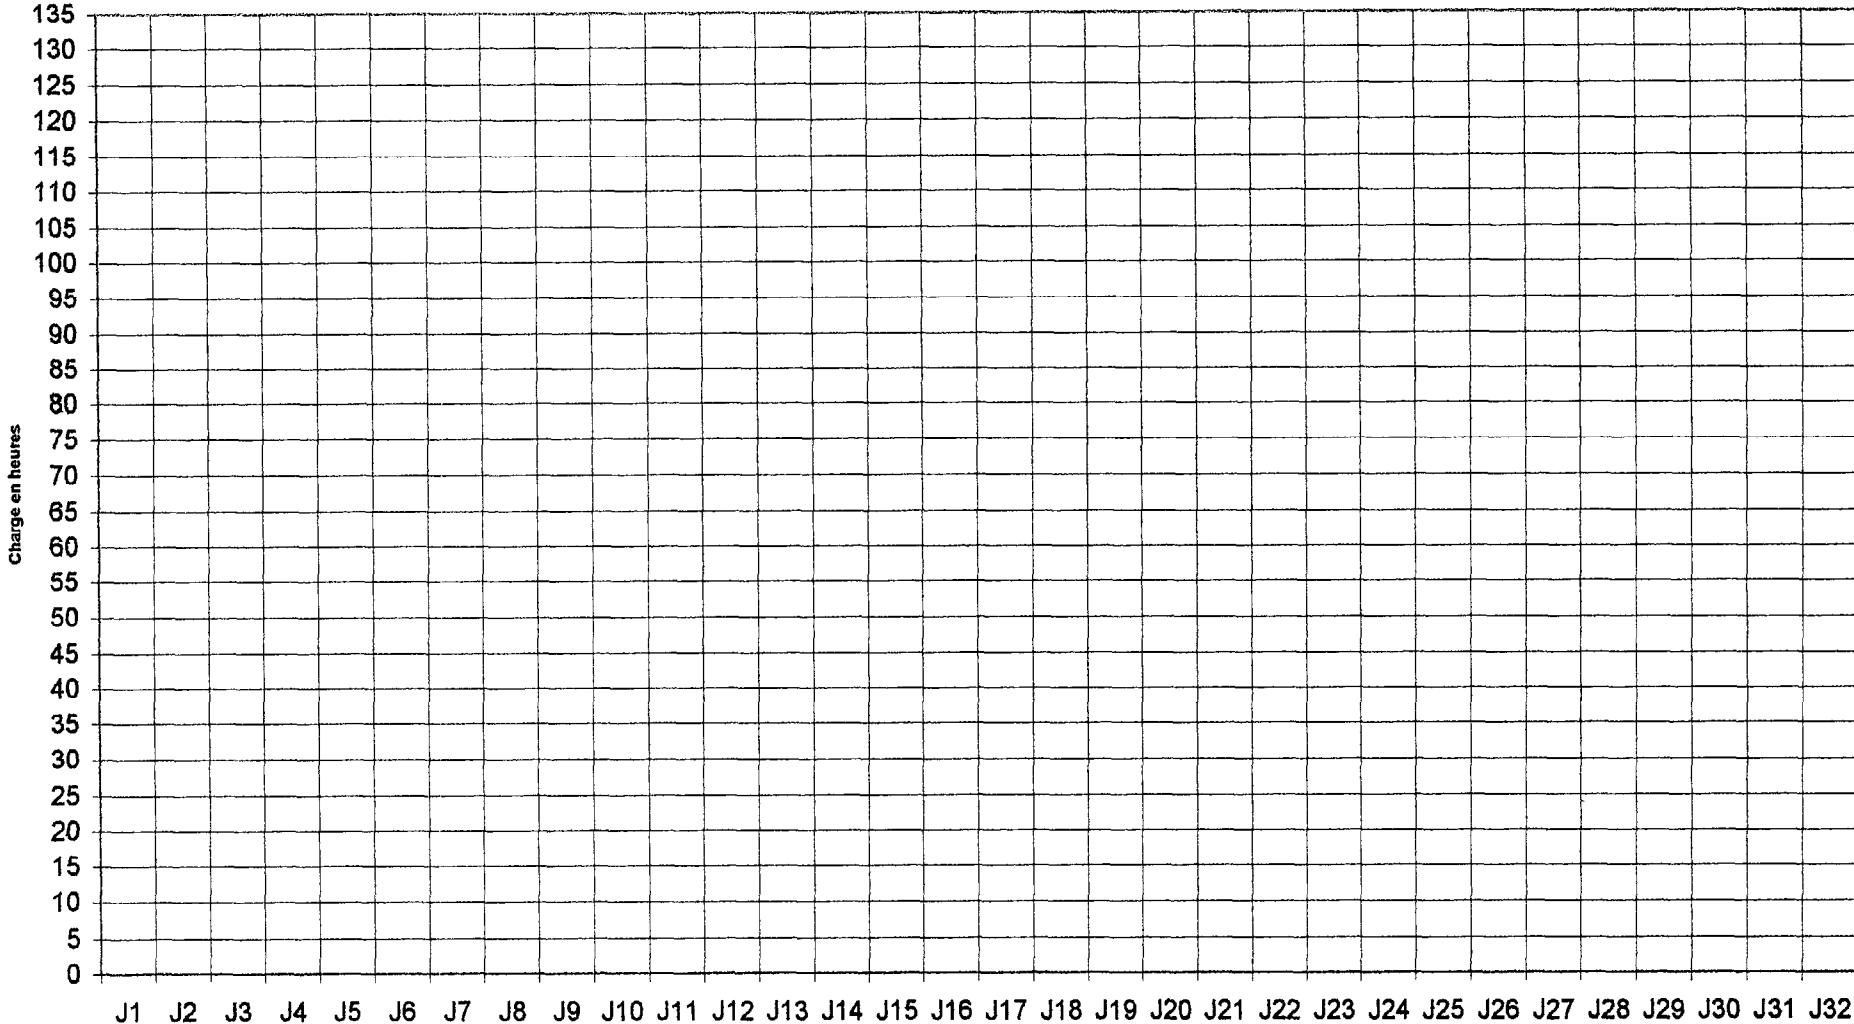

CNORG

PERT

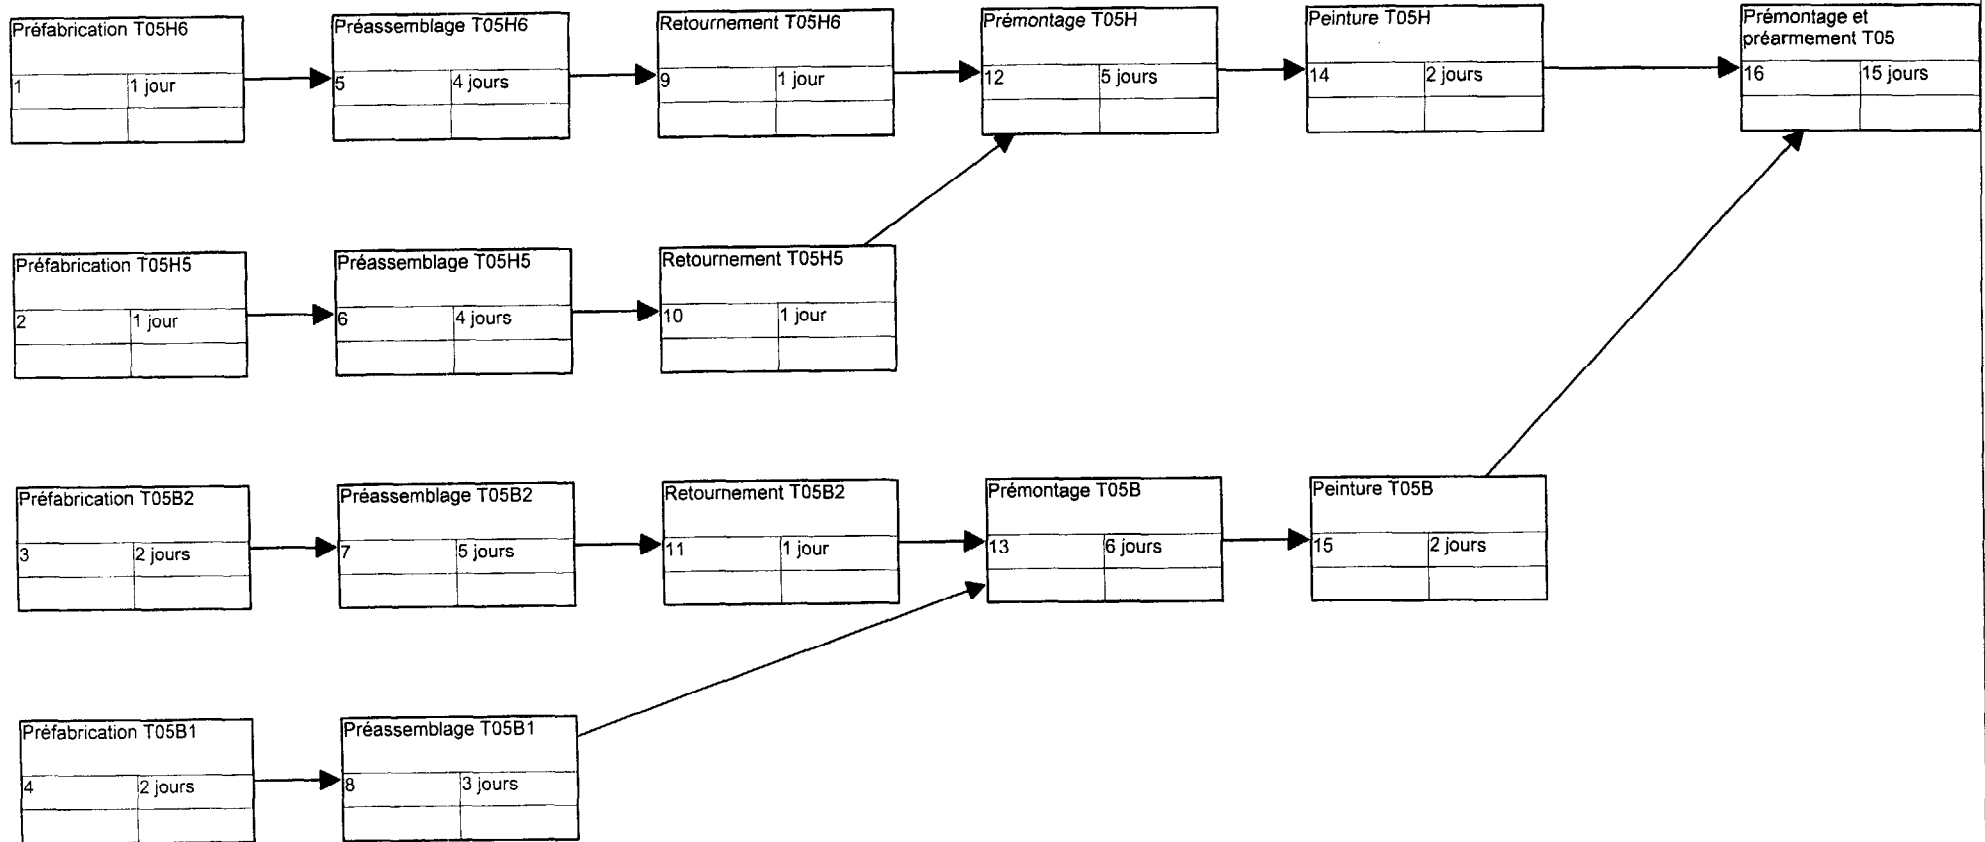

PERT

