

CORRIGÉ

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

SESSION 2008

Certificat d'Aptitude Professionnelle

CARRELEUR - MOSAISTE

EPREUVE EP. 2

Réalisation d'ouvrages courants en carrelage

Durée : 14 h 00 – Coefficient : 8

**BAREME ET POINTS DE
CONTROLES**

| BAREME DE CORRECTION | |
|-----------------------------|----------------------|
| Thèmes | Notes |
| Implantation | /10 |
| cloisons | /24 |
| Bac à douche | /4 |
| Marche et chape | /8 |
| Revêtement de sol | /18 |
| Revêtements des murs | /20 |
| Réception travaux | /16 |
| | |
| | TOTAL : / 100 |
| | Note : / 20 |


| C.A.P. Carreleur - Mosaïste | Session 2008 | BAREME | |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Epreuve : EP 2 Réalisation d'ouvrages courants en carrelage | Coeff. : 8 | Durée : 14 H | B 1 / 3 |

Barème de correction

N° du candidat :

| <u>TRAVAIL EVALUE</u> | |
|---|--|
| Différents postes | Evaluation ou commentaires |
| <p><u>IMPLANTATION</u></p> <p>Le respect des cotes d'exécution. 800, 1720, 870mm Le traçage est d'équerre et conforme aux plans.</p> | <p><i>Evaluation en cours d'épreuve</i> <i>A la fin de la 1^{ère} journée</i> <i>Evaluation en cours d'épreuve</i> <i>A la fin de la 1^{ère} journée</i></p> |
| <p><u>PREPARER ET METTRE EN PLACE LES CLOISONS</u></p> <p>Le respect des cotes. 800,870mm L'équerrage L'aplomb ±5mm La planéité Le niveau</p> | <p>.../4 .../4 .../8 .../4 .../4</p> |
| <p><u>METTRE EN PLACE LE BAC A DOUCHE</u></p> <p>Le bac est de niveau</p> | <p>.../4</p> |
| <p><u>MACONNER LA MARCHÉ ET COULER LA CHAPE</u></p> <p>Le mortier de la chape est bien dosé, la mise en œuvre correcte La face de la marche (contremarche) est d'aplomb et plane</p> | <p><i>Evaluation en cours d'épreuve</i></p> <p>...../6 .../2</p> |
| <p><u>POSER UN REVETEMENT DE SOL METHODE SCELLE</u></p> <p>La technique utilisée est correcte Les carreaux sont axés sur l'emplacement, répartition harmonieuse Il n'existe aucune balèvre et aucun décrochement. Le sol fini est de niveau Les joints sont réguliers et lissés</p> | <p><i>Evaluation en cours d'épreuve</i></p> <p>.../4 .../4 .../4 .../4 .../2</p> |
| <p><u>POSER UN REVETEMENT MURAL METHODE COLLE</u></p> <p>La technique utilisée est correcte Les carreaux sont axés sur l'emplacement, répartition harmonieuse Planéité du panneau central ±5mm Les joints sont réguliers et lissés</p> | <p><i>Evaluation en cours d'épreuve</i></p> <p>.../6 .../4 .../8 .../2</p> |
| <p><u>RECEPTION DES TRAVAUX</u></p> <p>Les vêtements de travail sont adaptés au métier. Les conditions d'hygiène et de sécurité sont respectées L'ouvrage et l'environnement sont propres Les outils et matériels mis à disposition sont nettoyés et rangés, tous les gravats sont triés et évacués.</p> | <p><i>Evaluation en cours d'épreuve</i> <i>Evaluation en cours d'épreuve</i> <i>Evaluation en cours d'épreuve</i></p> <p>.../2 .../2 .../10 .../2</p> |
| TOTAL | |
|/100 | |

| | |
|---|--------------|
| C.A.P. Carreleur - Mosaïste | Session 2008 |
| EP 2 - Réalisation d'ouvrages courants en carrelage | B 2 / 3 |

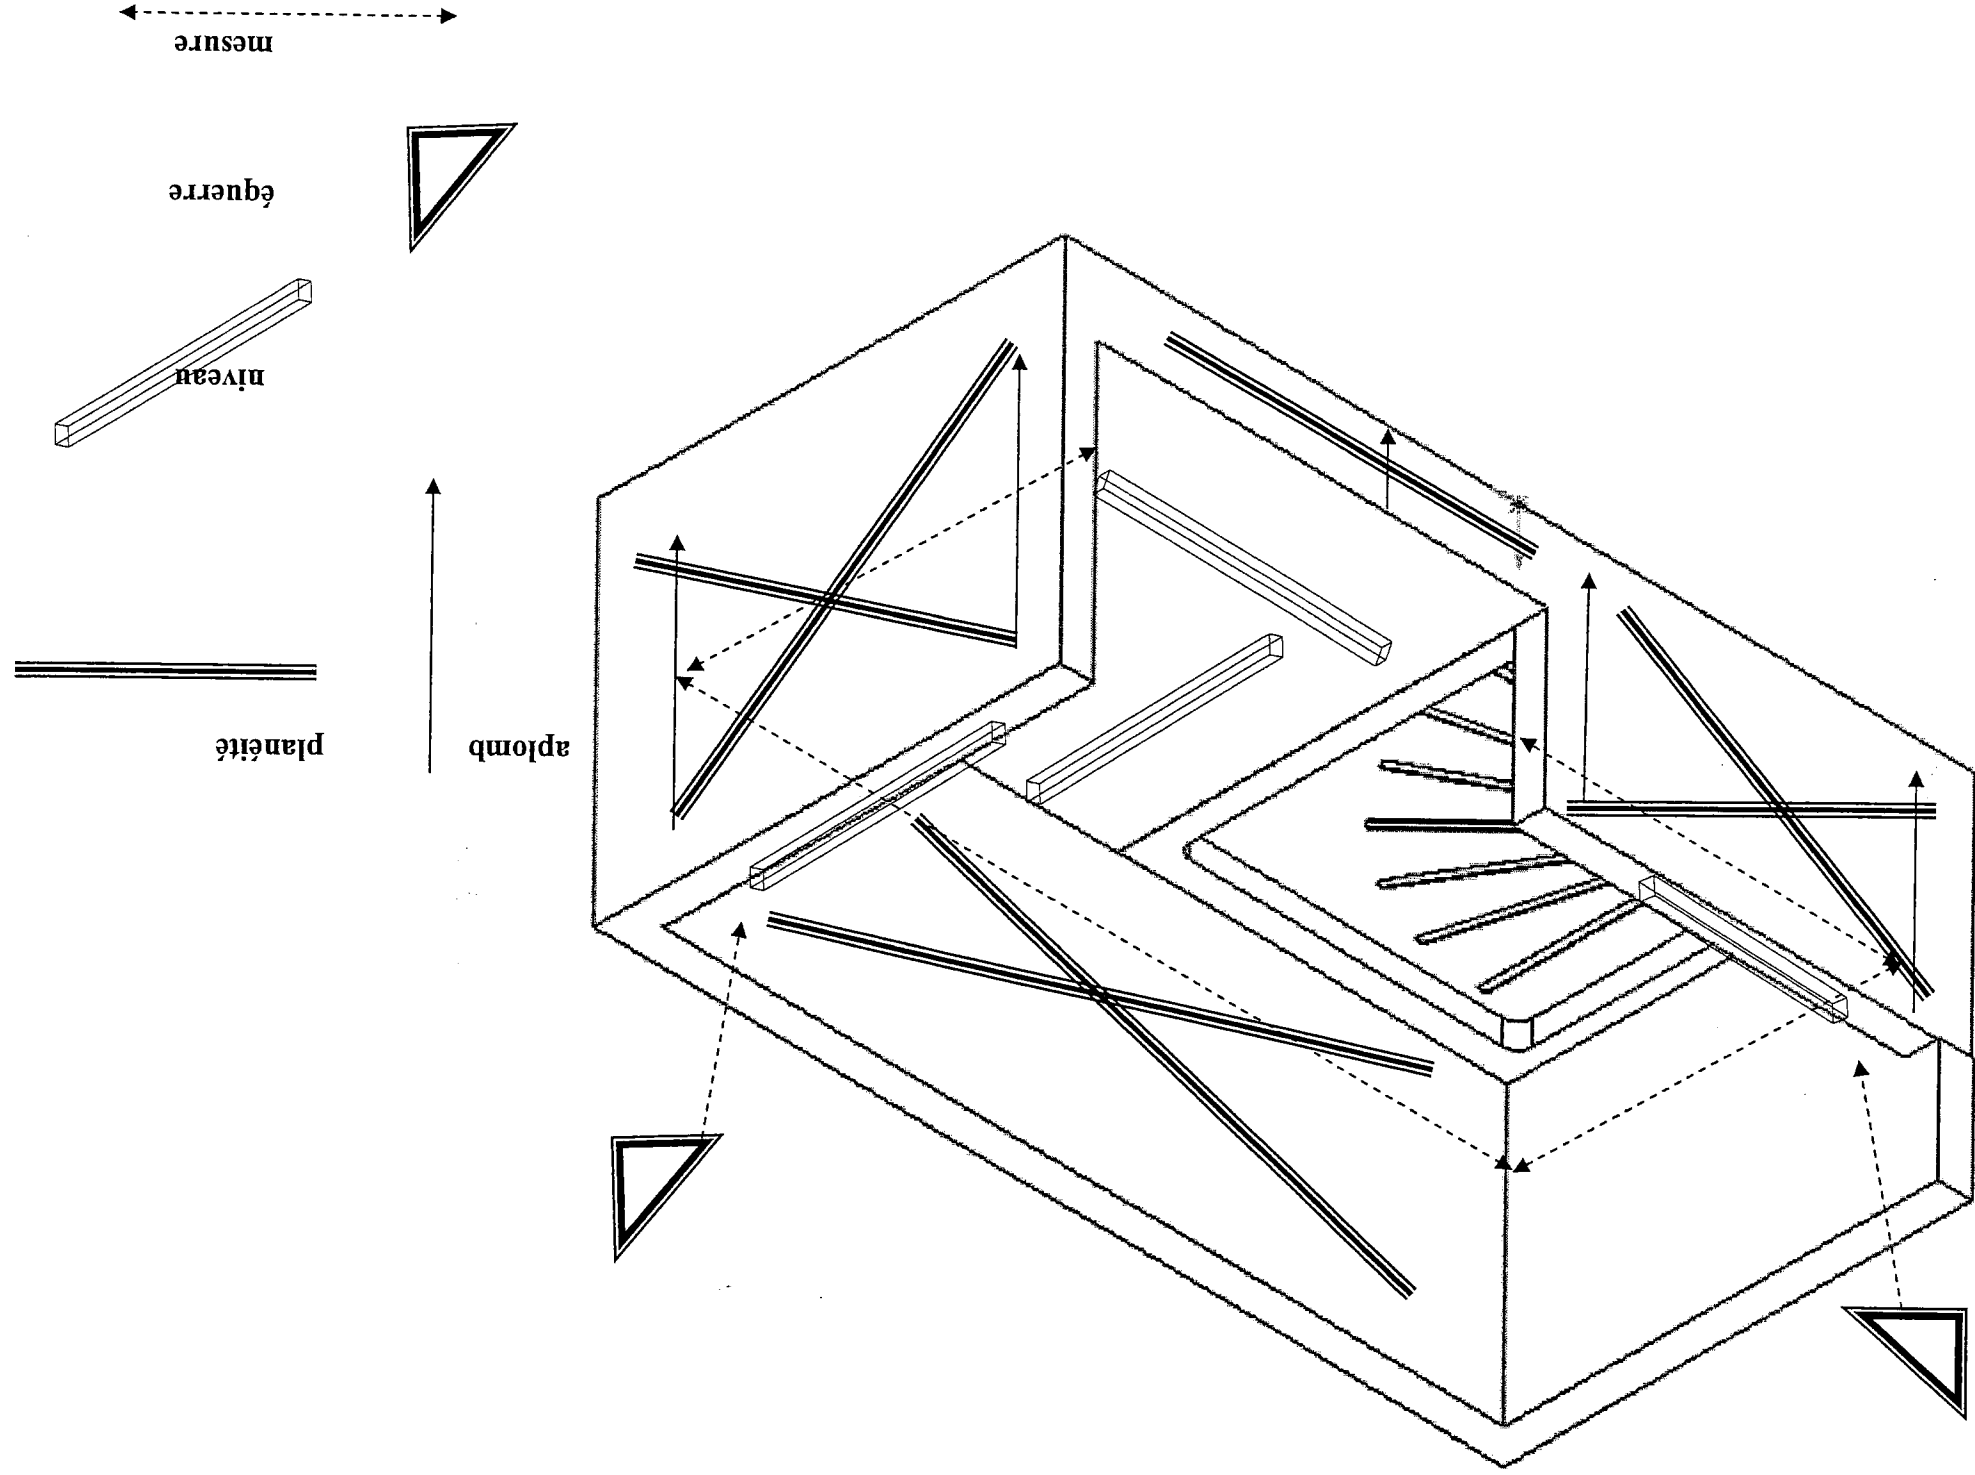

REMARQUE :

Voici sur cette planche l'endroit où les contrôles doivent être faits.
 Exemple :
 Les équerres sont clairement matérialisées.
 Dans un souci d'équité au niveau national il est logique que toutes les corrections dans toutes les académies, se fassent de la même manière avec la même notation.

| | | |
|-----------------------------|--------------|---|
| C.A.P. Carreleur - Mosaïste | Session 2008 | EP 2 - Réalisation d'ouvrages courants en carrelage |
| | | B 3 / 3 |
