

C.A.P. PLATRERIES - PLATRES - PREFABRIQUES

Epreuve : EP2 - Préparation et mise en oeuvre



Durée : 8 heures

Coefficient : 6

page 1/1

N° candidat :

SUJET

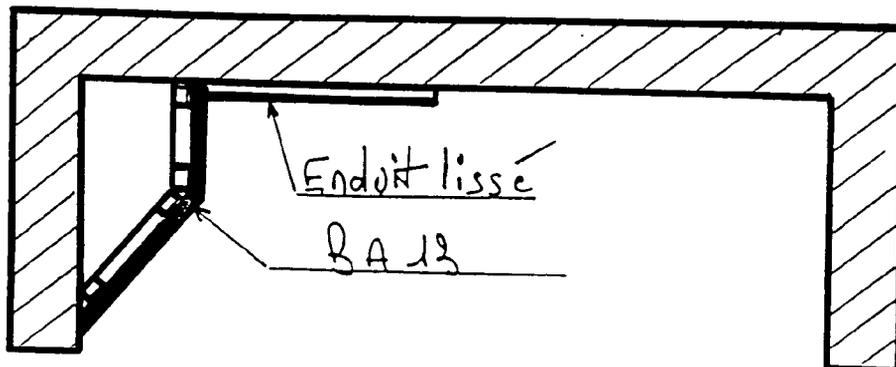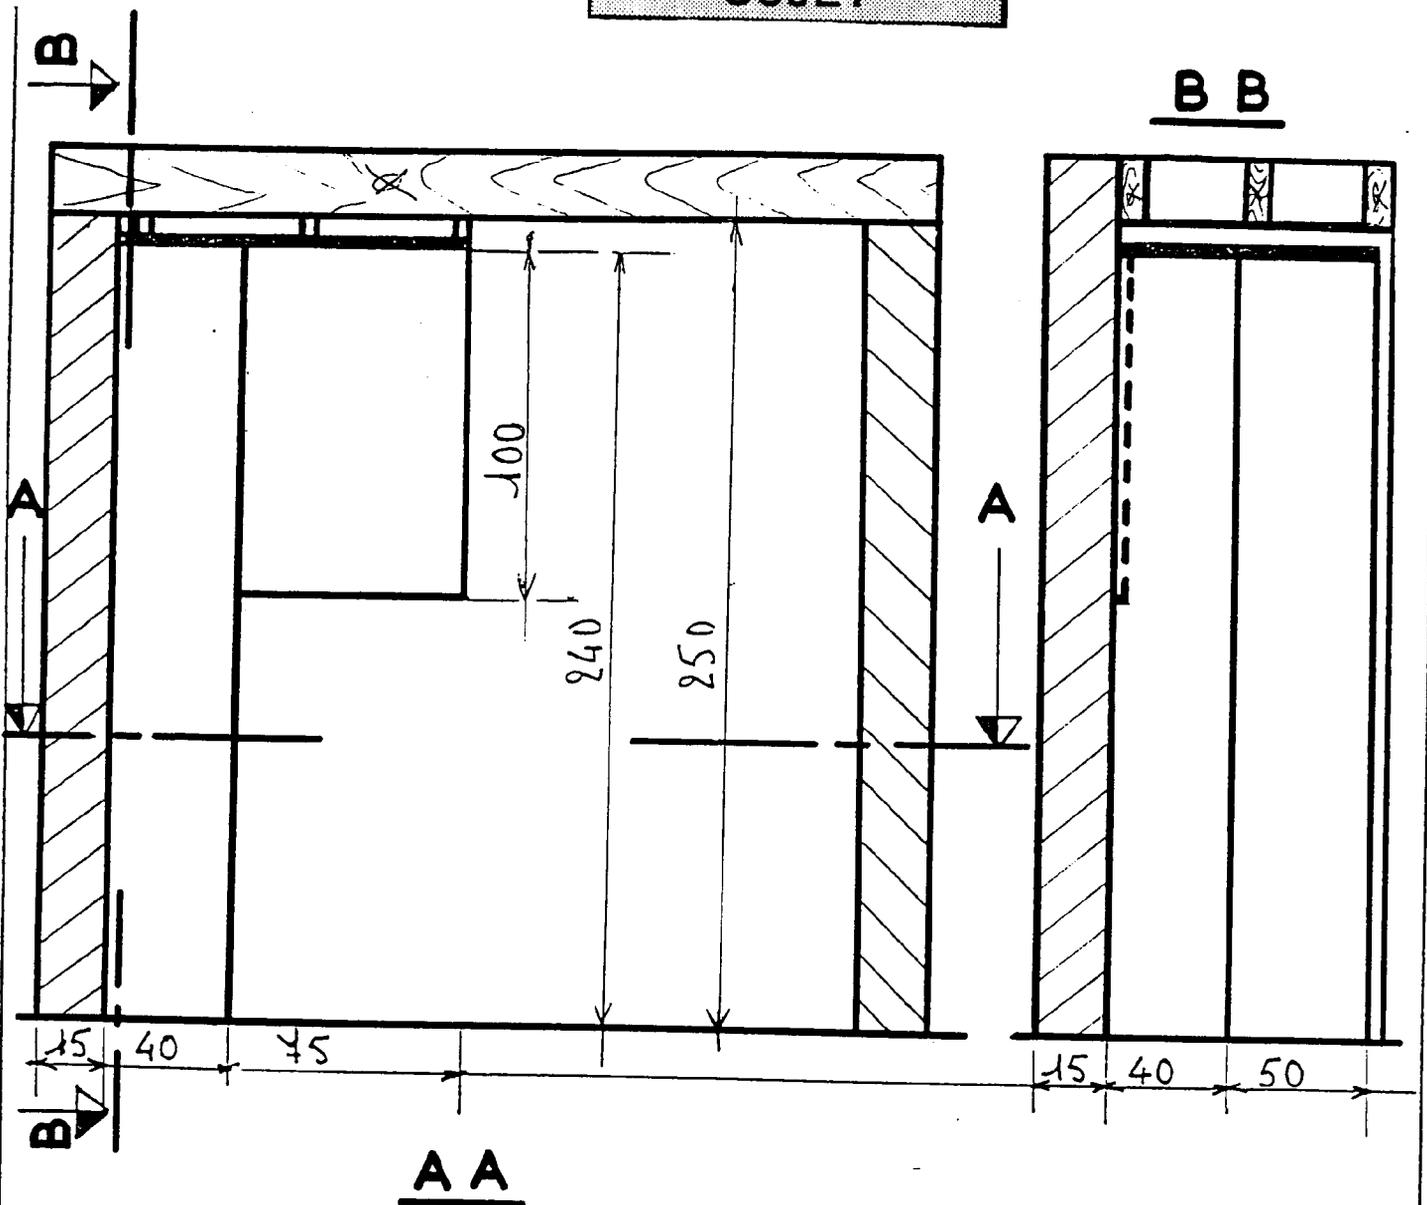

TRAVAIL DEMANDE

Plafond suspendu BA 13
 Caisson d'angle avec pan coupé
 Enduit en tête de cabine au plâtre
 manuel non lissé.
 Exécution des finitions et du
 jointement.

C.A.P. PLATRERIES - PLATRES - PREFABRIQUES

Epreuve : EP2 - Préparation et mise en oeuvre

Durée : 4 heures

Coefficient : 6

page 1/1

N° candidat :

BAREME

REPERES	POINTS POSSIBLES	POINTS ALLOUES	TOTAL
<u>IMPLANTATION</u> <u>+TRACES:</u>	/20		
<u>RESPECT DES</u> <u>NORMES</u>	/20		
<u>POSE DE L'</u> <u>OSSATURE</u>	/20		
<u>PARTIE</u> <u>CAISSON:</u>			
Cotation:	/20		
Aplomb:	/20		
Planéité:	/10		
Equerrage:	/10		
<u>PARTIE</u> <u>PLAFOND:</u>			
Niveau:	/10		
Planéité:	/20		
<u>JOINTS</u> <u>RACCORDS</u>			
Aspect/propreté:	/10		
<u>PARTIE</u> <u>ENDUITE:</u>			
Cotation:	/10		
Planéité:	/20		
Aspect:	/10		
TOTAL:	/200		

NOTE: / 200
