


# BEP FINITION

## Plâtrerie Plâtre et Préfabriqués

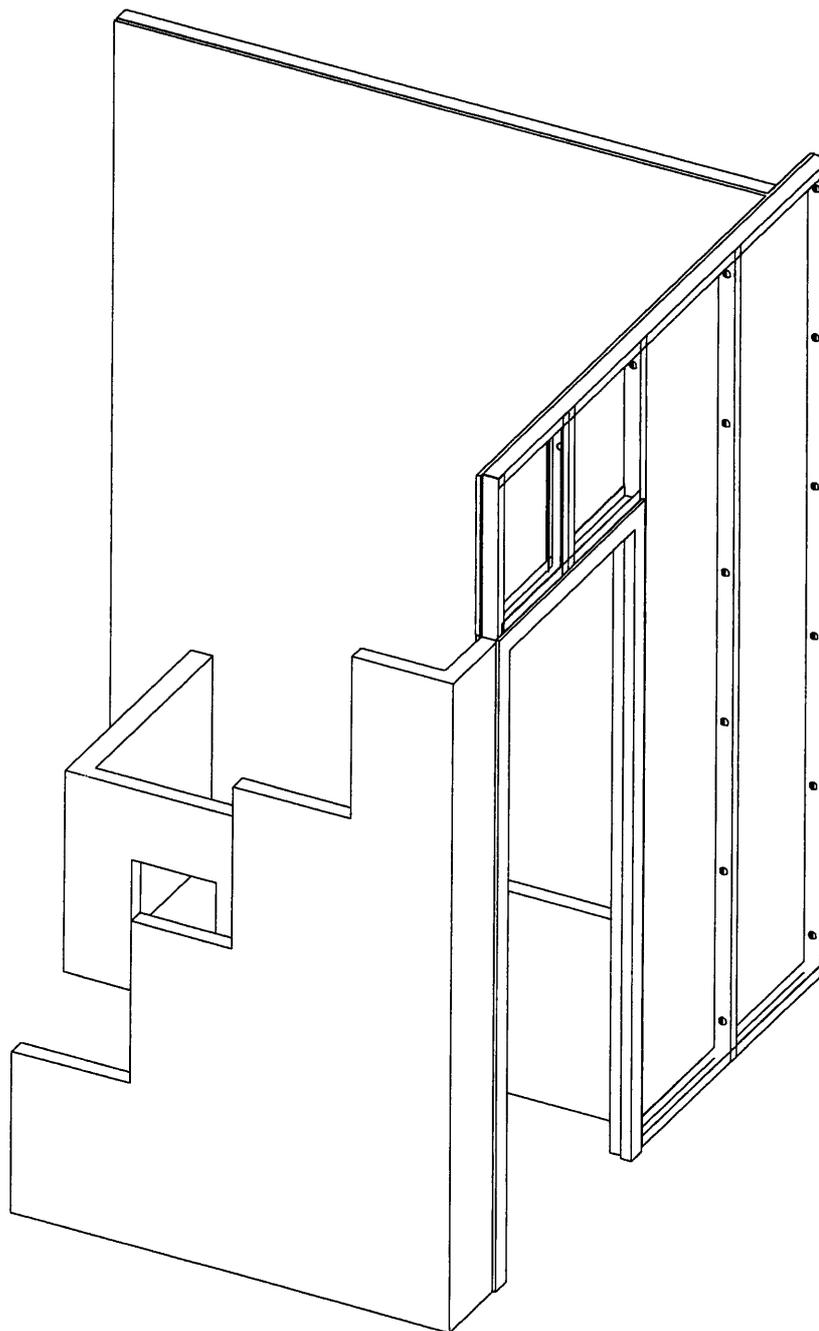

## BEP FINITION

DOMINANTE : Plâtrerie Plâtre et Préfabriqués

EP1 Réalisation et technologie

### EPREUVE PRATIQUE

#### COMPETENCES EVALUEES

Savoirs faire professionnels :

#### C3 METTRE EN ŒUVRE ET REALISER

C3 3 Organiser le poste de travail  
3 Organiser le poste de travail

C3 2 S'adapter aux contraintes de chantier  
2 Implanter, tracer  
4 poser une huisserie  
6 Réaliser un raccord de plâtre  
7 Débiter et ajuster des profilés

C3 8 Construire, enduire au plâtre  
2 Construire une cloison en brique creuses  
6 Enduire manuellement au plâtre

C3 9 Aménager avec des composants plâtre  
3 Construire une cloison avec des plaques  
6 Fixer des plaques sur ossatures métal  
11 Traiter les joints

BEP	Session : 2005	Sujet n° : 04 - 2108
Spécialité : BEP FINITION Dominante : Plâtrerie Plâtre et Préfabriqués EP1 : Réalisation et technologie <i>Epreuve pratique</i>		Folio : 2 / 5
Code Spécialité : 5123301 B	Durée : 16 h	Coefficient : 5

## OUVRAGE A REALISER :


Lors du déroulement des épreuves, les candidats s'engagent à respecter :

- Les règles élémentaires de sécurité concernant leur propre personne et celle d'autrui,
- Les matériaux, le matériel et l'outillage confiés.

### Définition de l'ouvrage :

L'ensemble est constitué de :



- A.** Une cloison de type 'placostil', 1 parement, (Plaques de plâtre sur ossature métallique),
- B.** Une cloison de carreaux de plâtre,
- C.** Une huisserie ,
- D.** Une cloison de briques plâtrières.

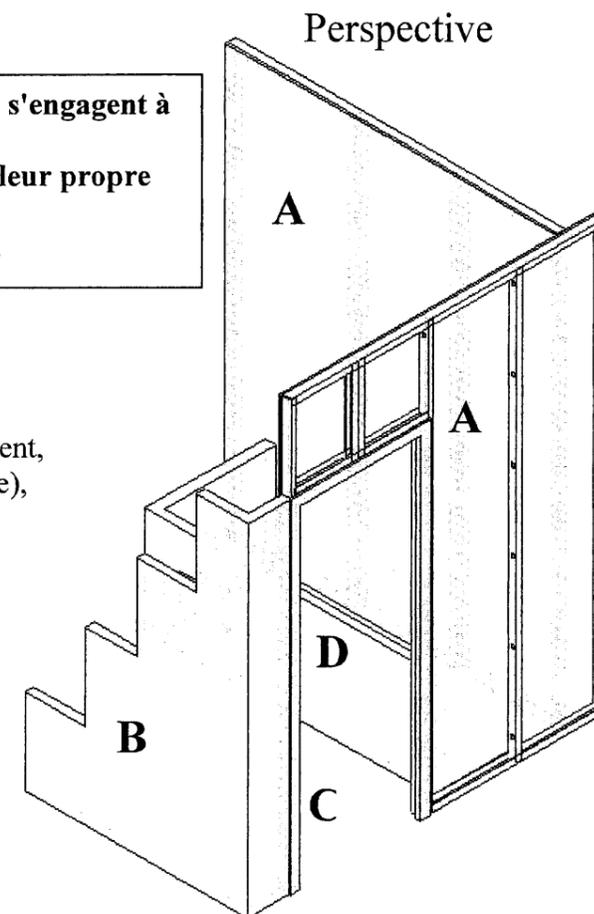

### TRAVAIL DEMANDE :

- ✓ Implanter, tracer l'ensemble de l'ouvrage suivant plan, Doc. 4 / 5,
- ✓ Débiter, et mettre en place une ossature métallique (rails et montants),
- ✓ Découper, poser, fixer des plaques de plâtre sur les parties repérées : **A**  
**A : 1 seul parement (cote intérieur)**
- ✓ Positionner, assurer le maintien d'une huisserie, repère **C**
- ✓ Mettre en œuvre une cloison de carreaux de plâtre de 50 mm d'épaisseur sur U pvc en partie basse, (4 hauteurs de carreaux) repère **B**, suivant plan Doc. 5 / 5. Poser un renfort d'angle métallique,
- ✓ Poser des bandes de joint calicot aux raccords de plaques ainsi qu'à la jonction du plafond,
- ✓ Réaliser les joints entre bords francs et angles rentrants sur l'ensemble des raccords,
- ✓ Assurer la finition des plaques de plâtre à l'enduit,
- ✓ Bâtir une cloison de briques plâtrières de 5 \* 20 \* 40 repère **D**, suivant plan, Doc. 4 / 5. Poser une cornière d'angle métallique, enduire manuellement au plâtre,
- ✓ Assurer le nettoyage du poste de travail, et de l'outillage.

BEP	Session : 2005	Sujet n° : 04 - 2108
Spécialité : BEP FINITION Dominante : Plâtrerie Plâtre et Préfabriqués EP1 : Réalisation et technologie <i>Epreuve pratique</i>		Folio : 3 / 5
Code Spécialité : 5123301 B	Durée : 16 h	Coefficient : 5

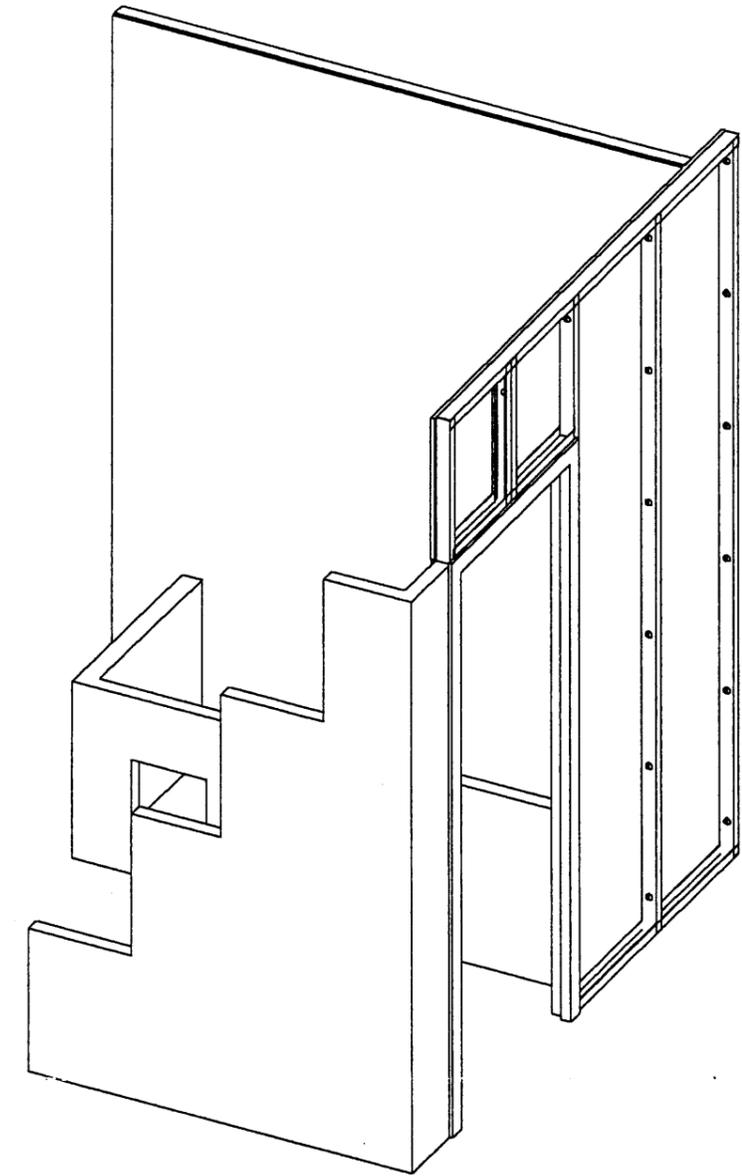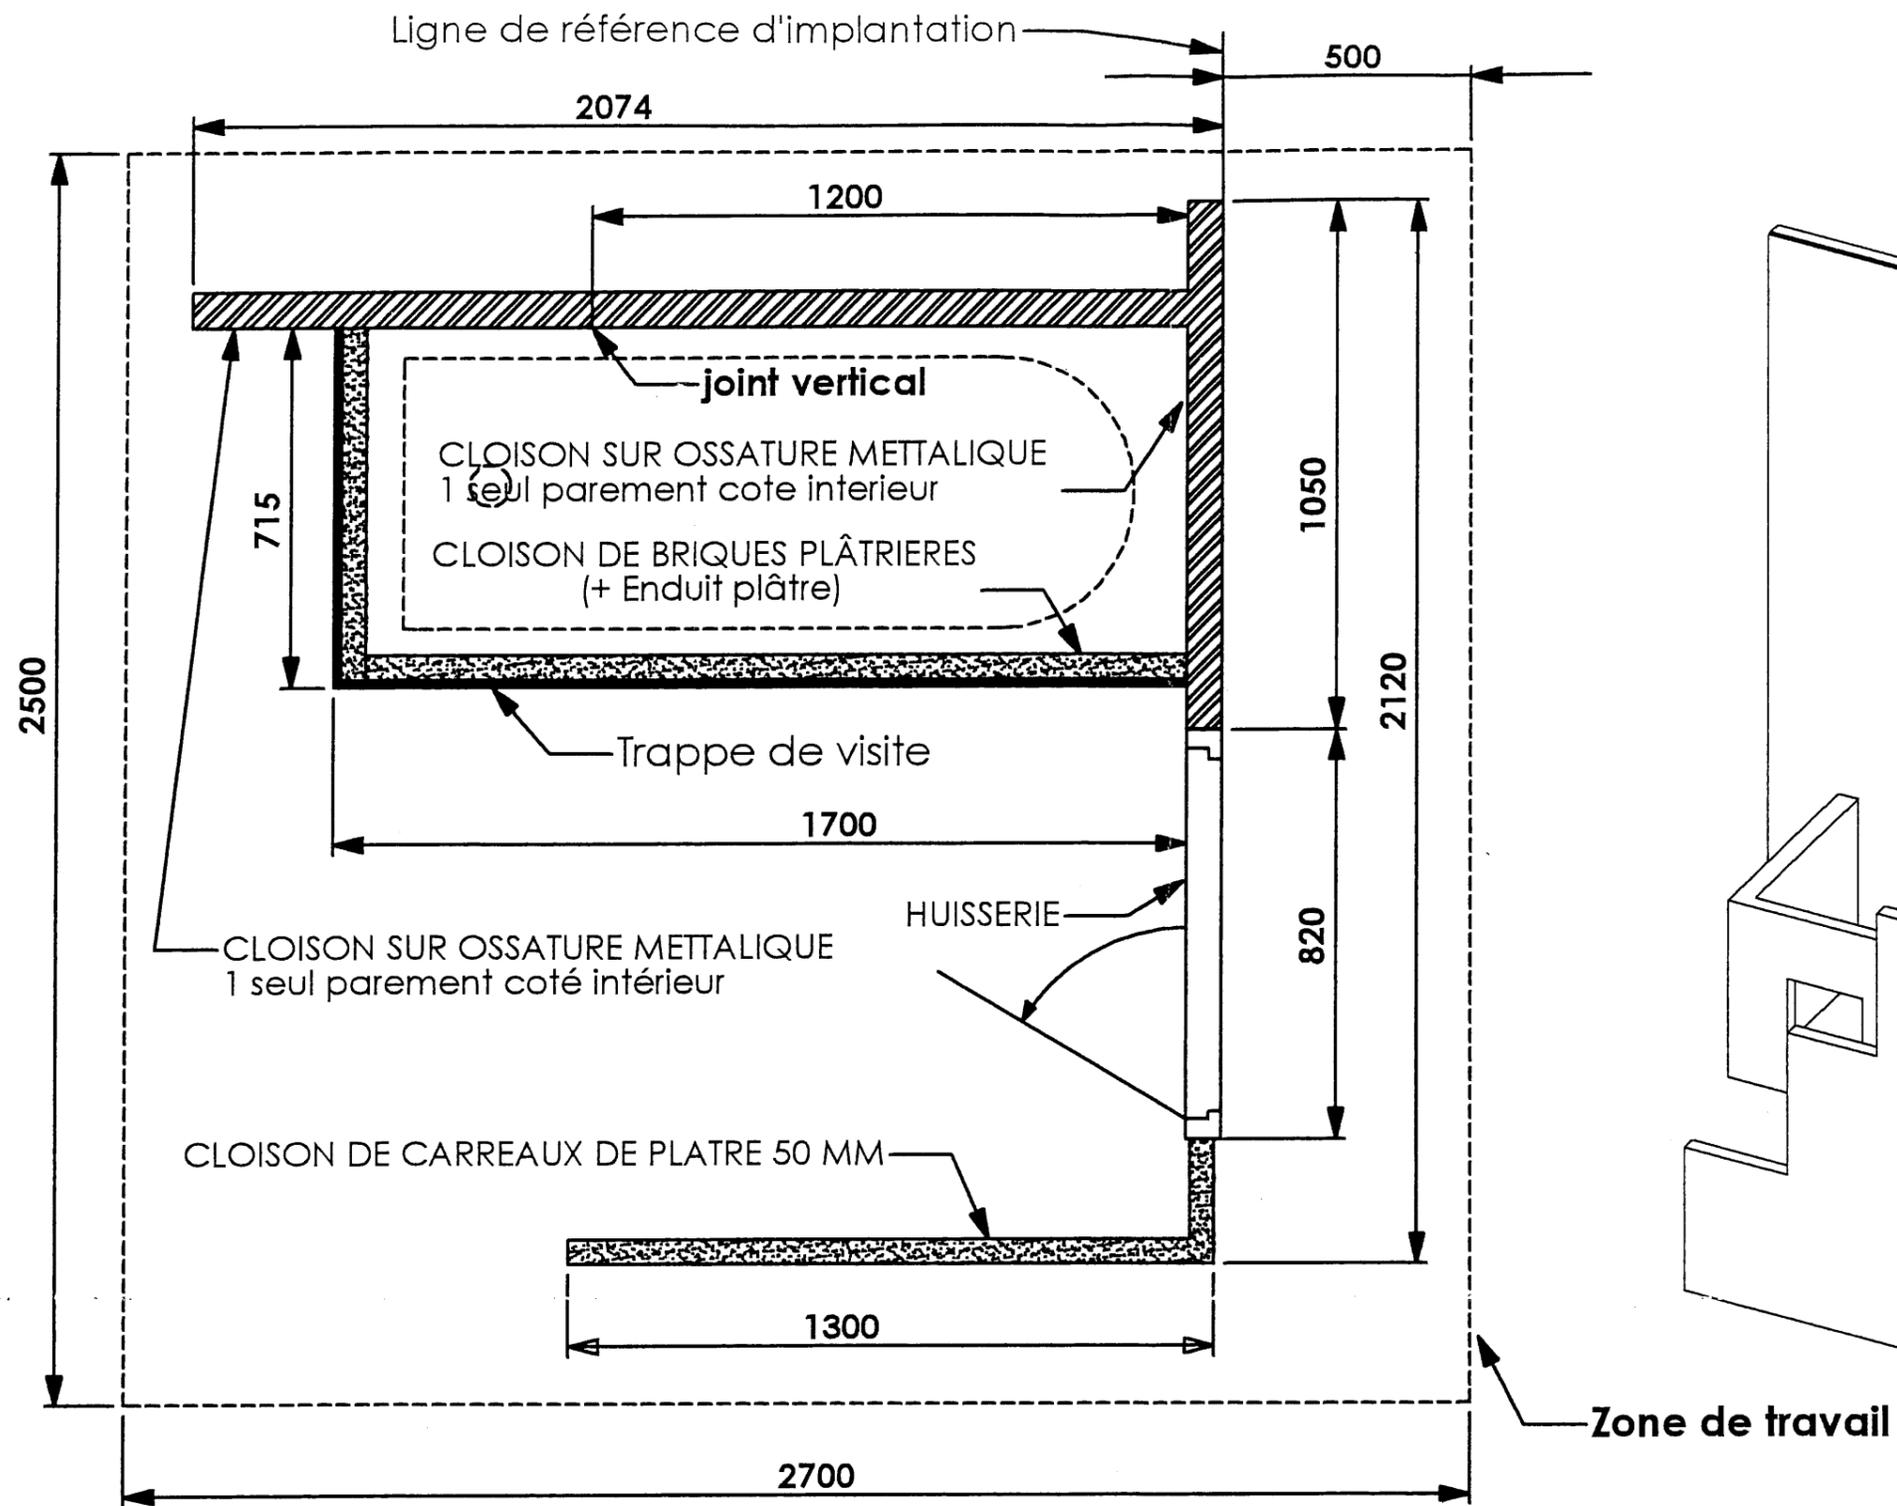

## EP1 Réalisation: *Implantation de l'ouvrage*

lors du déroulement des épreuves, les candidats s'engagent à respecter:

- Les règles élémentaires de sécurité concernant leur propre personne et celle d'autrui,
- Les matériaux, le matériel et l'outillage confiés.

**BEP**

Session : 2005

Sujet n° : 04 - 2108

Spécialité : **BEP FINITION**

Dominante : Plâtrerie Plâtre et Préfabriqués

Folio : **4 / 5**

**EP1 : Réalisation et technologie** *Epreuve pratique*





Code Spécialité : 5123301 B

Durée : 16 h

Coefficient : 5

lors du déroulement des épreuves, les candidats s'engagent à respecter:

- Les règles élémentaires de sécurité concernant leur propre personne et celle d'autrui,
- Les matériaux, le matériel et l'outillage confiés.

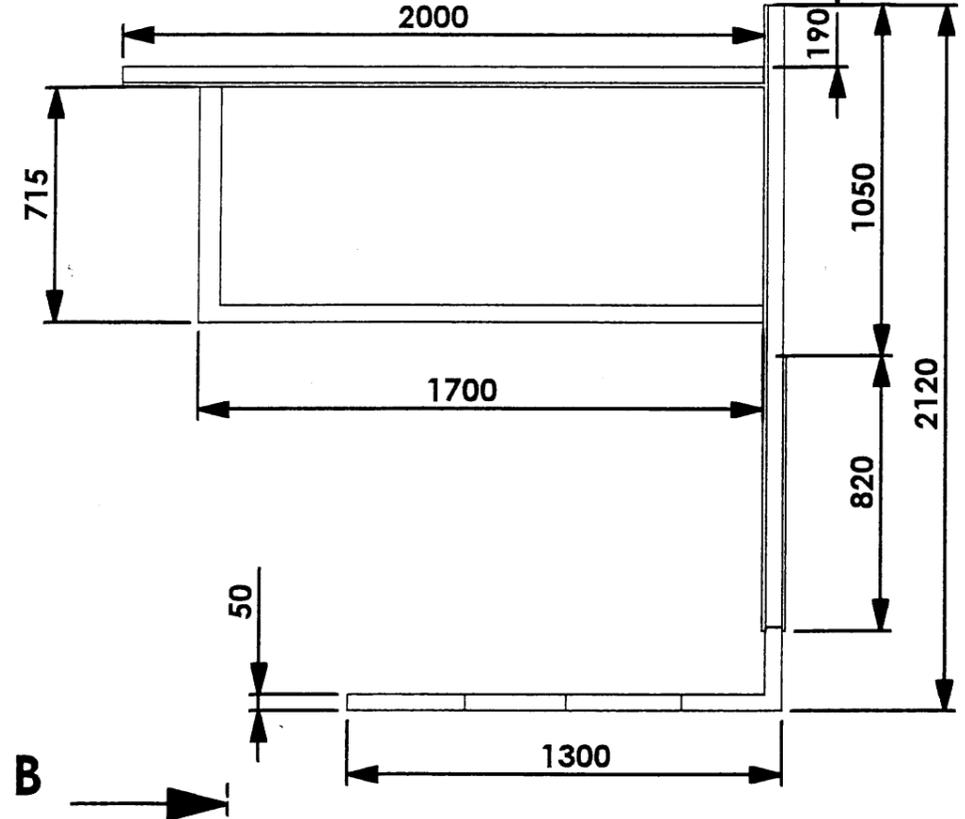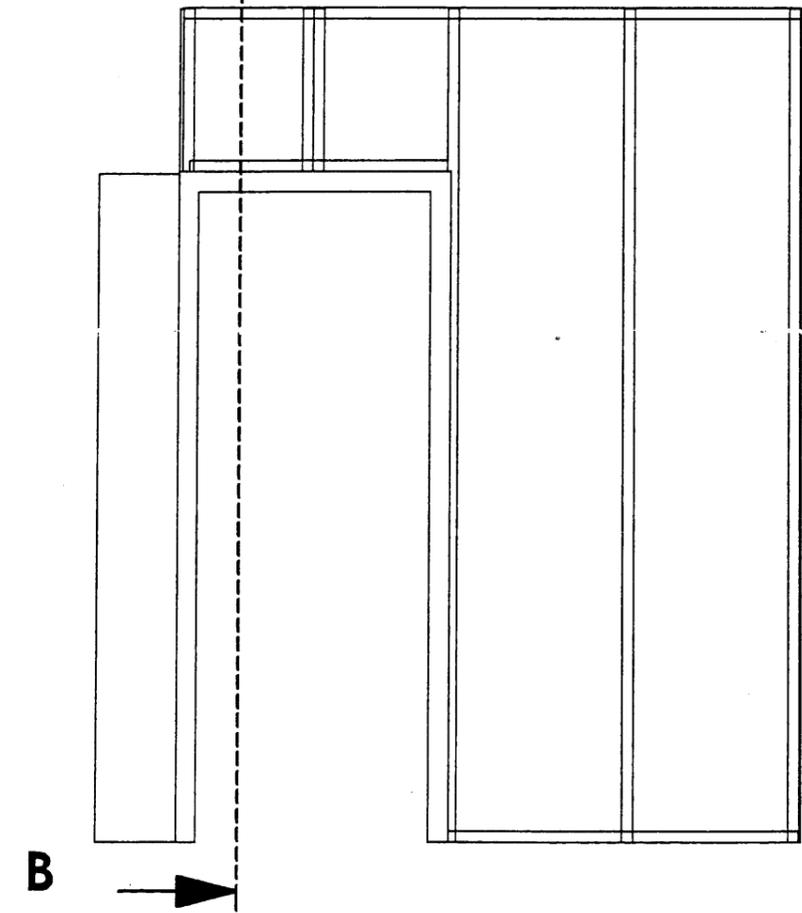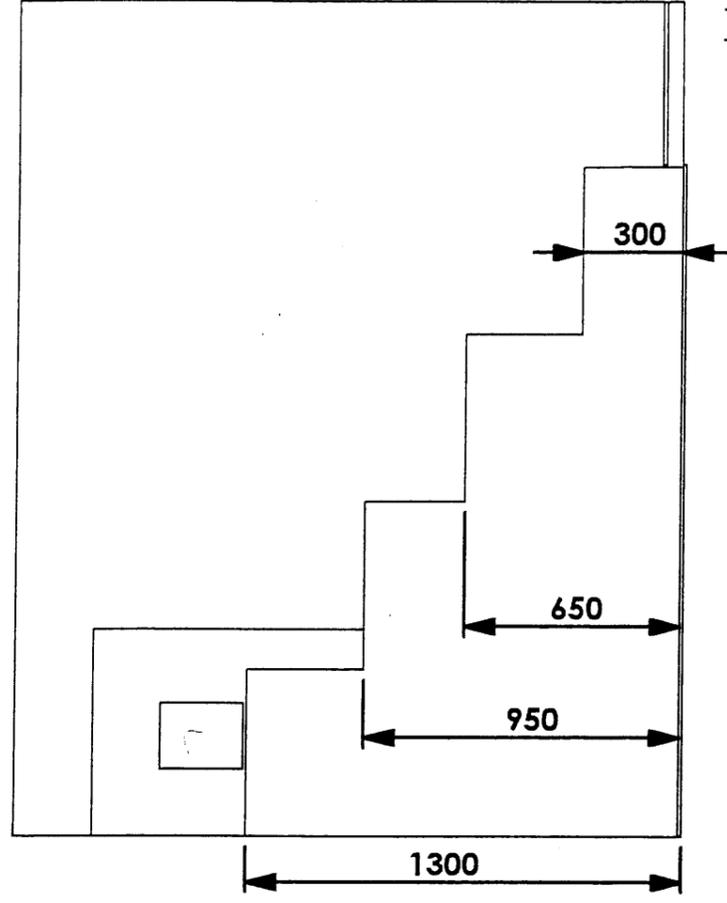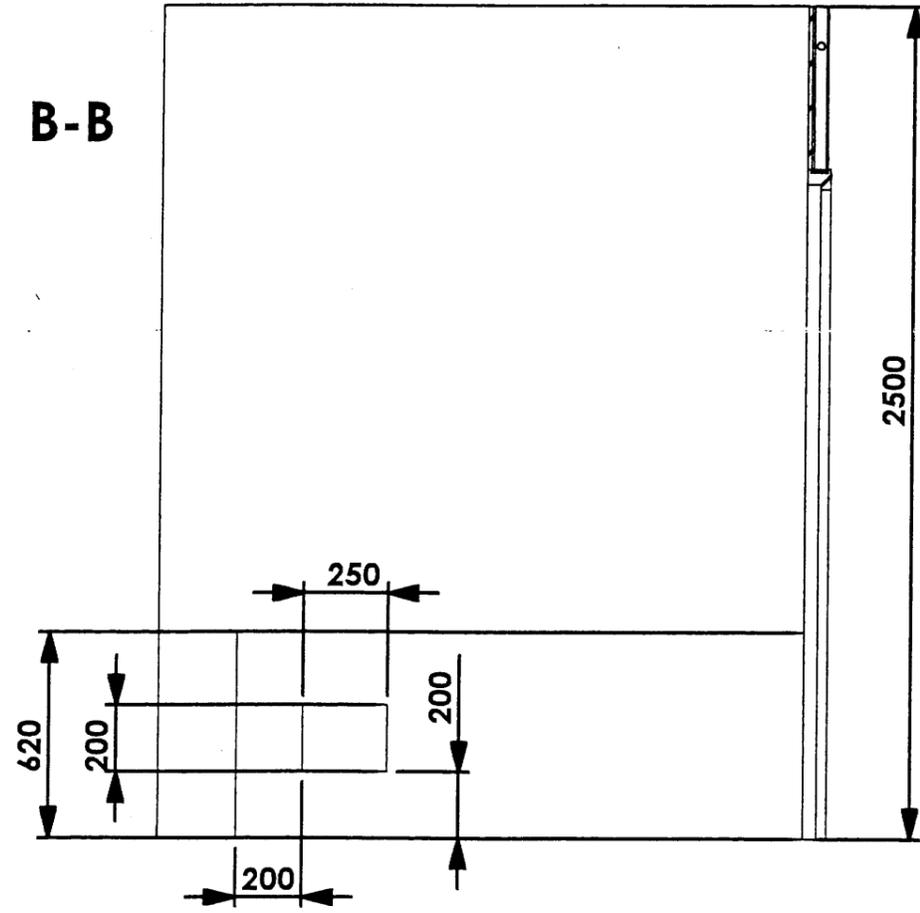

<b>BEP</b>	Session : 2005	Sujet n° : 04 - 2108
Spécialité : <b>BEP FINITION</b>		
Dominante : Plâtrerie Plâtre et Préfabriqués		
<b>EP1</b> : Réalisation et technologie <i>Epreuve pratique</i>		
Code Spécialité : 5123301 B	Durée : 16 h	Coefficient : 5
		Folio : 5 / 5
