



SERVICES CULTURE ÉDITIONS
RESSOURCES POUR
L'ÉDUCATION NATIONALE

**Ce document a été numérisé par le CRDP de Caen pour la
Base Nationale des Sujets d'Examens de l'enseignement
professionnel**

EP2 Réalisation d'ouvrages simples
Unité UP2 - ponctuelle pratique

DOSSIER CORRIGE

Durée de l'épreuve : 14 h

Coefficient : 8

Ce dossier comprend 2 documents :


- Page de garde

page 1 / 2

- Fiche contrat et barème d'évaluation

page 2 / 2

| | | | | |
|--|----------------------------|---------|-------------------|--------------------|
| | Session | 2010 | Facultatif : code | 02GB08 |
| Examen et spécialité | | | | |
| CAP Solier - Moquettiste | | | | |
| Intitulé de l'épreuve | | | | |
| EP2 Réalisation d'ouvrages simples – ponctuelle pratique | | | | |
| Type | Facultatif : date et heure | Durée | Coefficient | N° de page / total |
| DOSSIER CORRIGE | | 14 h 00 | 8 | 1/2 |

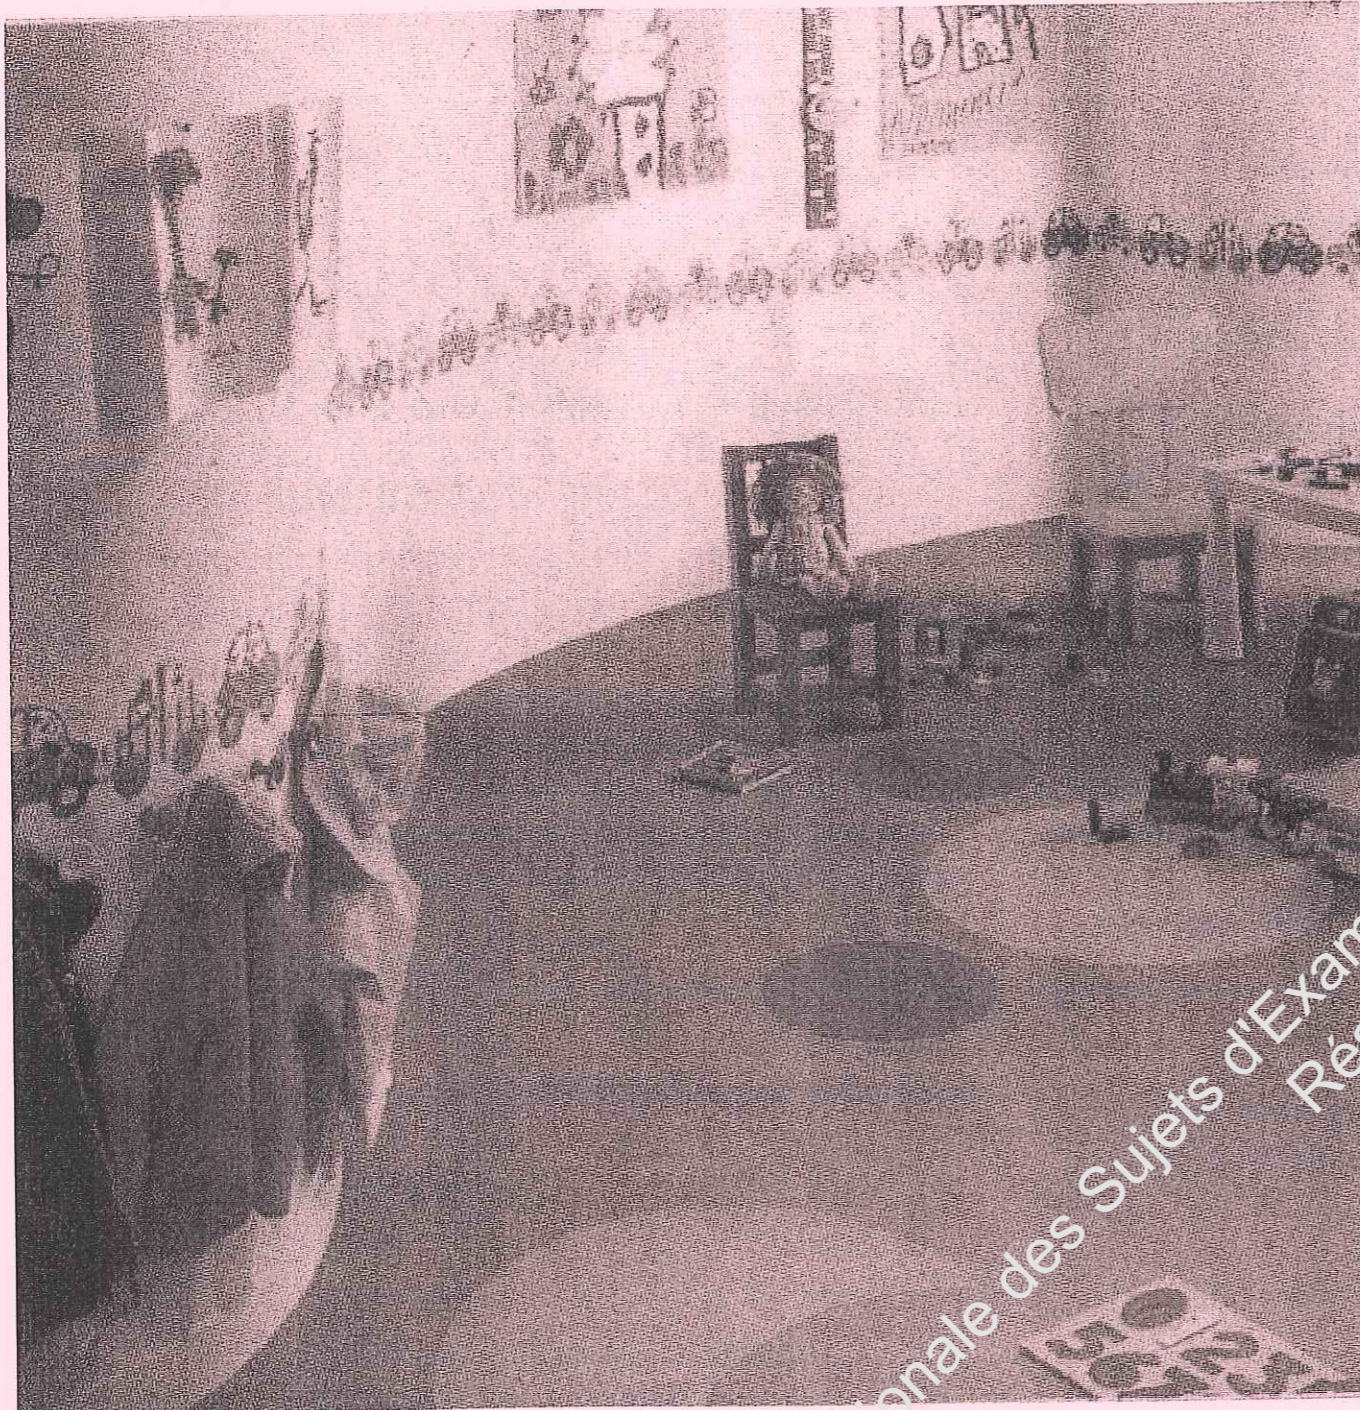

Base Nationale des Sujets d'Examens
 Réseau Scénario de l'Enseignement Professionnel

FICHE CONTRAT – EVALUATION

N° d'inscription :

N° de cabine :

| Compétences | Ojectifs | Conditions données | Performances attendues | Barème |
|---|---|--|---|--|
| C3. 17. 02 Pose de dalles | PARTIE A : - Pose droite en damier* de dalles PVC 0.30 m. La pose des dalles sur les axes devra être exécutée de telle façon que la largeur des dalles périphériques ne soit pas inférieure à ½ dalle. * Sens des marbrures contrarié. | - Revêtement de sol en dalles 0.30 x 0.30 type Colovinyl de chez Forbo. 16 dalles ref. 967 pervenche. - Colle polyvalente pour sol. 300 g. | - L'implantation est correcte. - Les découpes périphériques sont sans défaut. - Les découpes d'obstacle sont nettes. - Les dalles sont rendues propres. | ... / 15 ... / 20 ... / 20 ... / 10 |
| C3.17.01 Ragréer un sol | PARTIE B : - Ragréer et poncer la surface repérée B. | - Enduit de lissage UZIN (ou similaire) U3P3 (1 sac pour 6 candidats). | Evaluation en cours d'épreuve - L'environnement est propre et protégé. - Le dosage et l'homogénéité de l'enduit sont respectés. - L'enduit est sans cote et parfaitement lisse. | ... / 5 ... / 15 ... / 20 |
| C3.17.04 Pose de revêtement textile | PARTIE B : - Pose en deux tons d'un revêtement de sol aiguilleté avec joint axé dans la largeur (mentionné sur le plan). Le ton soutenu sera posé dans le prolongement de la largeur de l'escalier. | - Revêtement aiguilleté type Tapisom 300S : ton clair : 1.50 x 1.00 . Ref : 9547 (ton glacier), ton foncé* : 1.50 x 1.00 . Ref : 9541 (ton marine). - Colle polyvalente pour sol 400 g. | - Le joint vif est parfaitement rectiligne. - Les arasements périphériques sont nets. - Le marouflage est parfait. - La découpe du tuyau est précise. | ... / 10 ... / 15 ... / 10 ... / 10 |
| C3.17.02 Pose de revêtement PVC multicouche en lès | PARTIE D : - Pose d'un revêtement PVC multicouche U3 P3. | - Revêtement PVC U3 P3 type Sarlon trafic (ou similaire couleur bleu pastel ref : 33437) - Colle Quelyd HP sol 400 g. | - La pose du revêtement est sans cloques et plis. - L'arasement périphérique est net. - Absence de traces de colle. | ... / 20 ... / 20 ... / 10 |

Total de la page : ... / 200

Note : ... / 20
