


ANNEXE N°1

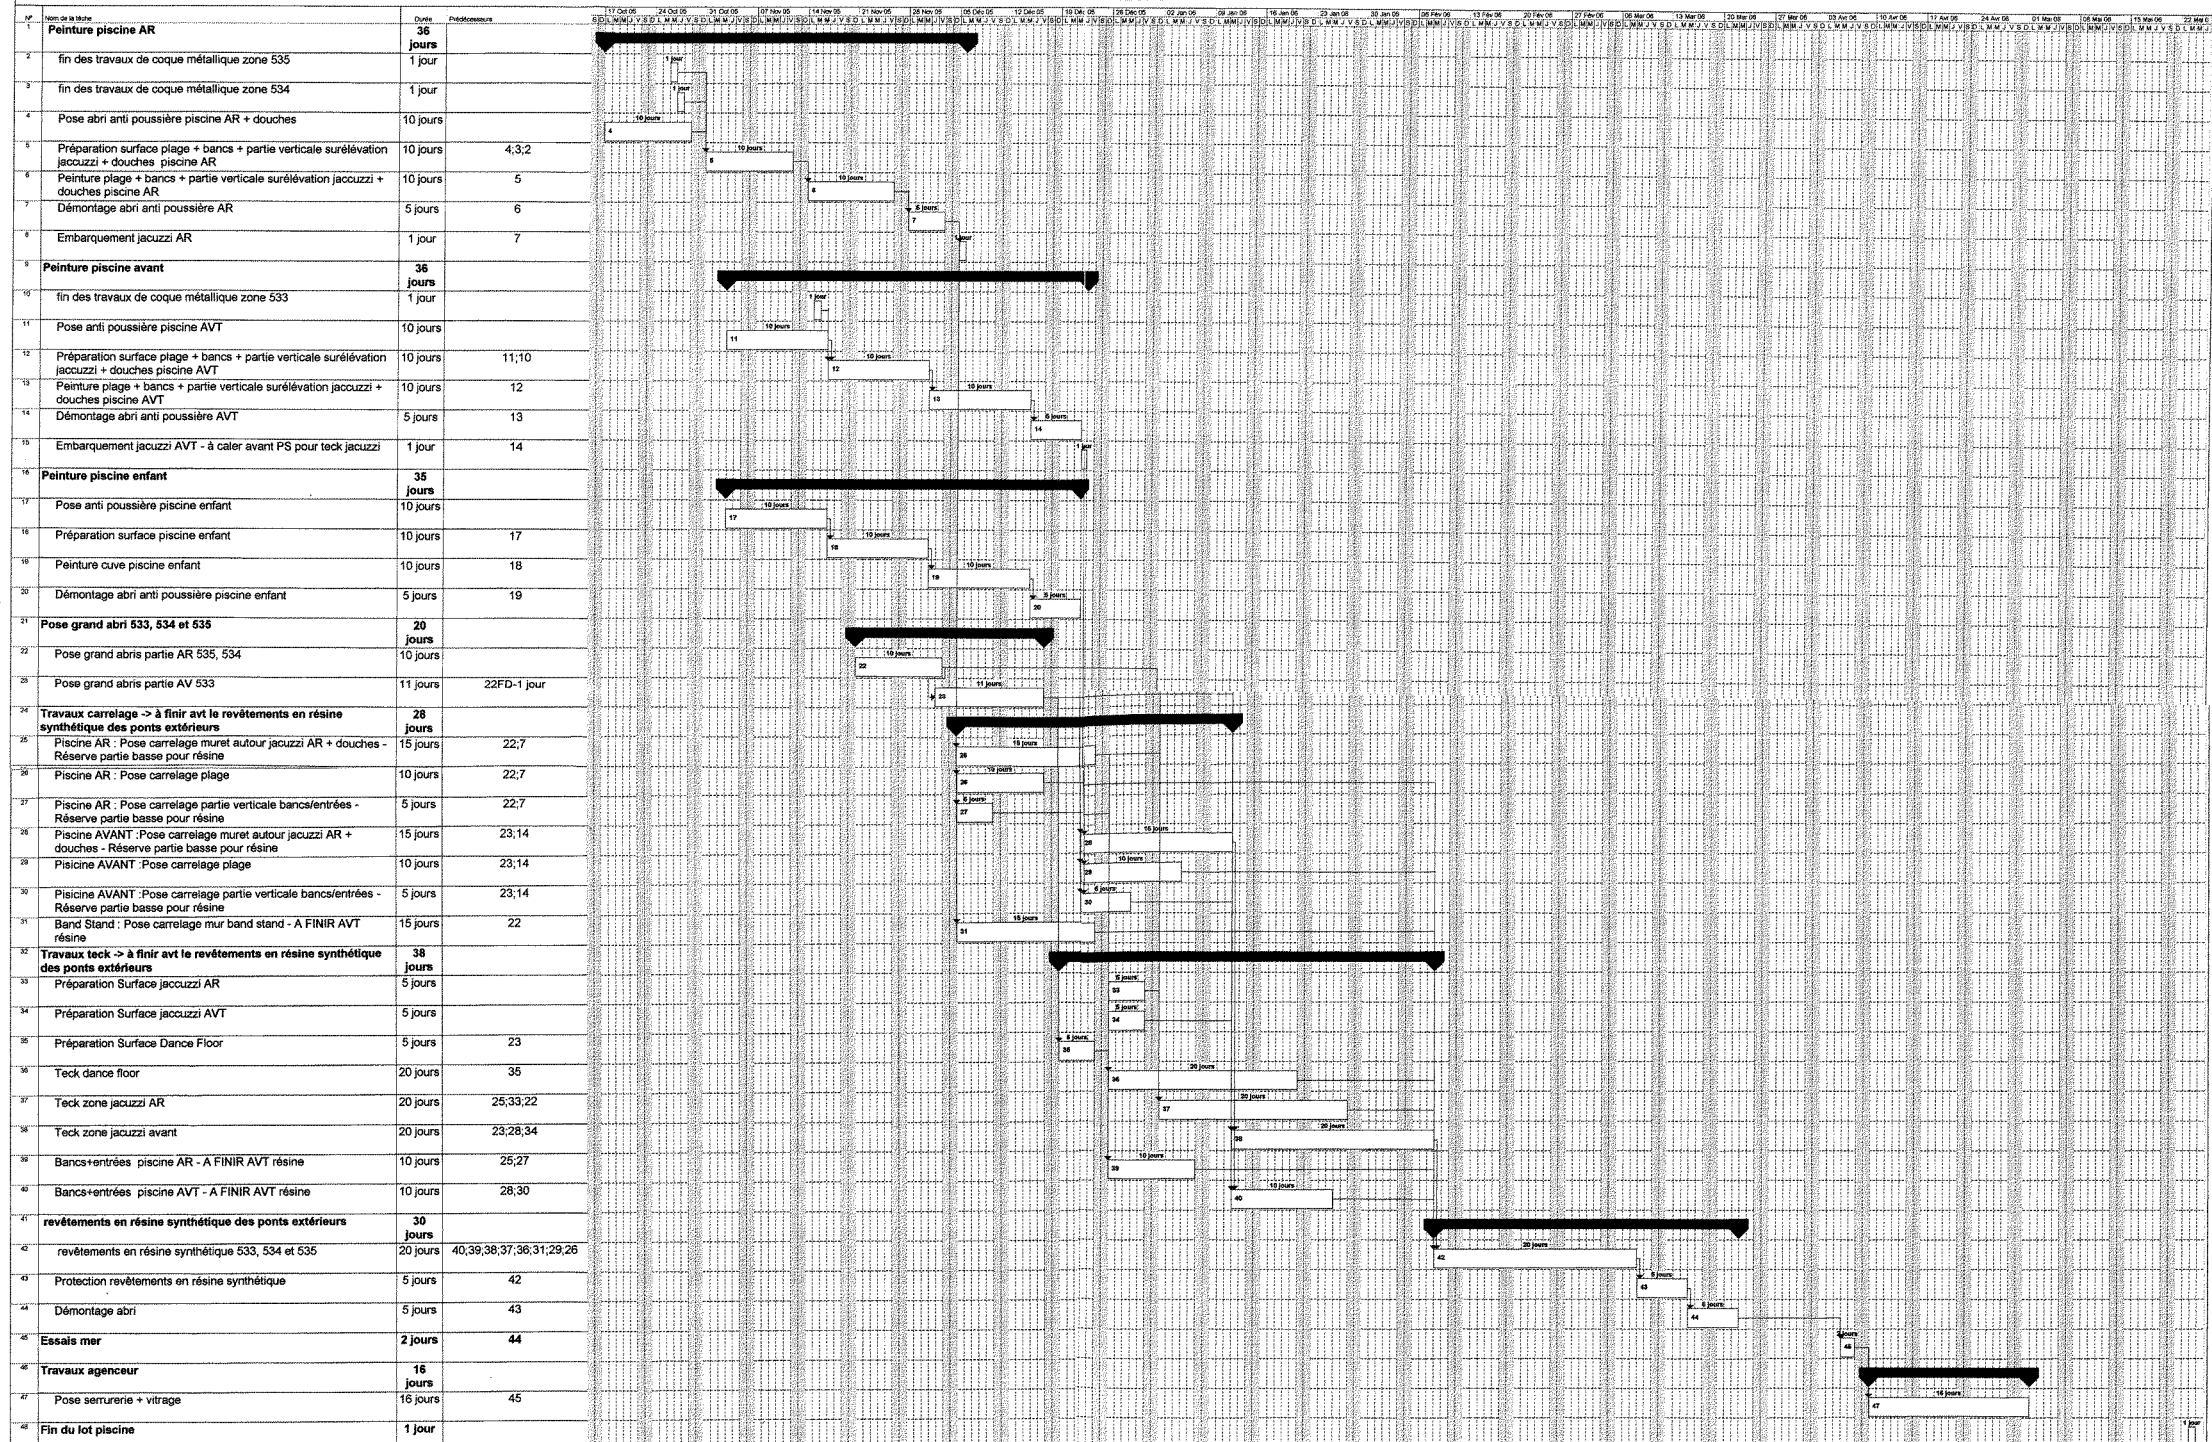

ANNEXE N°2

ETUDE D'AVANT PROJET

N°	Désignation tâche	Durée en jours	Prédécesseurs	Contraintes
1	Peinture piscine AR			
2	fin des travaux de coque métallique zone 535	1 jour		Doit finir le 26/10/05
3	fin des travaux de coque métallique zone 534	1 jour		Doit finir le 27/10/05
4	Pose abri anti poussière piscine AR + douches	10 jours		
5	Préparation surface plage + bancs + partie verticale surélévation jacuzzi + douches piscine AR	10 jours	4;3;2	
6	Peinture plage + bancs + partie verticale surélévation jacuzzi + douches piscine AR	10 jours	5	
7	Démontage abri anti poussière AR	5 jours	6	
8	Embarquement jacuzzi AR	1 jour	7	
9	Peinture piscine avant			
10	fin des travaux de coque métallique zone 533	1 jour		Doit finir le 15/11/05
11	Pose anti poussière piscine AVT	10 jours		Début au plus tôt le 03/11/05
12	Préparation surface plage + bancs + partie verticale surélévation jacuzzi + douches piscine AVT	10 jours	11;10	
13	Peinture plage + bancs + partie verticale surélévation jacuzzi + douches piscine AVT	10 jours	12	
14	Démontage abri anti poussière AVT	5 jours	13	
15	Embarquement jacuzzi AVT - à caler avant PS pour teck jacuzzi	1 jour	14	
16	Peinture piscine enfant			
17	Pose anti poussière piscine enfant	10 jours		Début au plus tôt le 03/11/05
18	Préparation surface piscine enfant	10 jours	17	
19	Peinture cuve piscine enfant	10 jours	18	
20	Démontage abri anti poussière piscine enfant	5 jours	19	
21	Pose grand abri 533, 534 et 535			
22	Pose grand abris partie AR 535, 534	10 jours		Début au plus tôt le 21/11/05
23	Pose grand abris partie AV 533	11 jours	22FD-1 jour	
24	Travaux carrelage -> à finir avt le revêtements en résine synthétique des ponts extérieurs			
25	Piscine AR : Pose carrelage muret autour jacuzzi AR + douches - Réserve partie basse pour résine	15 jours	22;7	
26	Piscine AR : Pose carrelage plage	10 jours	22;7	
27	Piscine AR : Pose carrelage partie verticale bancs/entrées - Réserve partie basse pour résine	5 jours	22;7	
28	Piscine AVANT :Pose carrelage muret autour jacuzzi AR + douches - Réserve partie basse pourrésine	15 jours	23;14	
29	Piscine AVANT :Pose carrelage plage	10 jours	23;14	
30	Piscine AVANT :Pose carrelage partie verticale bancs/entrées - Réserve partie basse pour résine	5 jours	23;14	
31	Band Stand : Pose carrelage mur band stand - A FINIR AVT résine	15 jours	22	
32	Travaux teck -> à finir avt le revêtements en résine synthétique des ponts extérieurs			
33	Préparation Surface jacuzzi AR	5 jours		Doit commencer le 26/12/05
34	Préparation Surface jacuzzi AVT	5 jours		Doit commencer le 26/12/05
35	Préparation Surface Dance Floor	5 jours	23	
36	Teck dance floor	20 jours	35	
37	Teck zone jacuzzi AR	20 jours	25;33;22	
38	Teck zone jacuzzi avant	20 jours	23;28;34	
39	Bancs+entrées piscine AR - A FINIR AVT résine	10 jours	25;27	
40	Bancs+entrées piscine AVT - A FINIR AVT résine	10 jours	28;30	
41	revêtements en résine synthétique des ponts extérieurs			
42	revêtements en résine synthétique 533, 534 et 535	20 jours	40;39;38;37;36;31;29;26	
43	Protection revêtements en résine synthétique	5 jours	42	
44	Démontage abri	5 jours	43	
45	Essais mer			
46	Travaux agenceur	2 jours	44	Doit commencer le 06/04/06
47	Pose serrurerie + vitrage	16 jours	45	
48	Fin du lot piscine	1 jour		Doit finir le 24/05/06

ANNEXE N°3

Calendrier

Mois d'OCTOBRE 2005

Lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5		
24	25	26	27	28	29	30
31						
Jour 11						

Mois de NOVEMBRE 2005

Lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
	1	2	3	4	5	6
	Jour 12	Jour 13	Jour 14	Jour 15		
7	8	9	10	11	12	13
Jour 16	Jour 17	Jour 18	Jour 19	Jour 20		
14	15	16	17	18	19	20
Jour 21	Jour 22	Jour 23	Jour 24	Jour 25		
21	22	23	24	25	26	27
Jour 26	Jour 27	Jour 28	Jour 29	Jour 30		
28	29	30				
Jour 31	Jour 32	Jour 33				

Mois de DECEMBRE 2005

Lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
			1	2	3	4
			Jour 34	Jour 35		
5	6	7	8	9	10	11
Jour 36	Jour 37	Jour 38	Jour 39	Jour 40		
12	13	14	15	16	17	18
Jour 41	Jour 42	Jour 43	Jour 44	Jour 45		
19	20	21	22	23	24	25
Jour 46	Jour 47	Jour 48	Jour 49	Jour 50		
26	27	28	29	30	31	
Jour 51	Jour 52	Jour 53	Jour 54	Jour 55		

Mois de JANVIER 2006

Lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
						1
2	3	4	5	6	7	8
Jour 56	Jour 57	Jour 58	Jour 59	Jour 60		
9	10	11	12	13	14	15
Jour 61	Jour 62	Jour 63	Jour 64	Jour 65		
16	17	18	19	20	21	22
Jour 66	Jour 67	Jour 68	Jour 69	Jour 70		
23	24	25	26	27	28	29
Jour 71	Jour 72	Jour 73	Jour 74	Jour 75		
30	31					
Jour 76	Jour 77					

Mois de FEVRIER 2006

Lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
		1	2	3	4	5
		Jour 78	Jour 79	Jour 80		
6	7	8	9	10	11	12
Jour 81	Jour 82	Jour 83	Jour 84	Jour 85		
13	14	15	16	17	18	19
Jour 86	Jour 87	Jour 88	Jour 89	Jour 90		
20	21	22	23	24	25	26
Jour 91	Jour 92	Jour 93	Jour 94	Jour 95		
27	28					
Jour 96	Jour 97					

Mois de MARS 2006

Lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
			1	2	3	4
		Jour 98	Jour 99	Jour 100		
6	7	8	9	10	11	12
Jour 101	Jour 102	Jour 103	Jour 104	Jour 105		
13	14	15	16	17	18	19
Jour 106	Jour 107	Jour 108	Jour 109	Jour 110		
20	21	22	23	24	25	26
Jour 111	Jour 112	Jour 113	Jour 114	Jour 115		
27	28	29	30	31		
Jour 116	Jour 117	Jour 118	Jour 119	Jour 120		

Mois d'AVRIL 2006

Lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
Jour 121	Jour 122	Jour 123	Jour 124	Jour 125		
10	11	12	13	14	15	16
Jour 126	Jour 127	Jour 128	Jour 129	Jour 130		
17	18	19	20	21	22	23
Jour 131	Jour 132	Jour 133	Jour 134	Jour 135		
24	25	26	27	28	29	30
Jour 136	Jour 137	Jour 138	Jour 139	Jour 140		

Mois de MAI 2006

Lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi	dimanche
1	2	3	4	5	6	7
Jour 141	Jour 142	Jour 143	Jour 144	Jour 145		
8	9	10	11	12	13	14
Jour 146	Jour 147	Jour 148	Jour 149	Jour 150		
15	16	17	18	19	20	21
Jour 151	Jour 152	Jour 153	Jour 154	Jour 155		
22	23	24	25	26	27	28
Jour 156	Jour 157	Jour 158				
29	30	31				
